
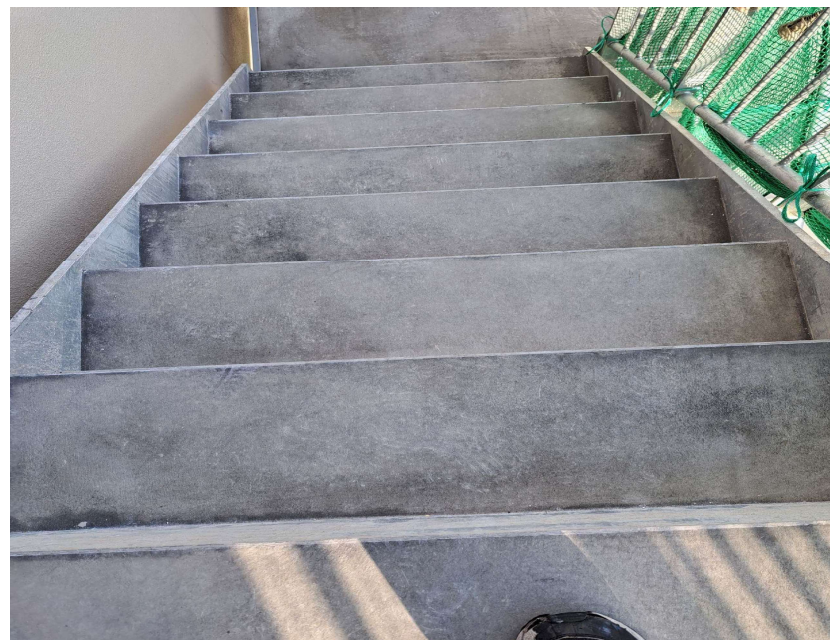


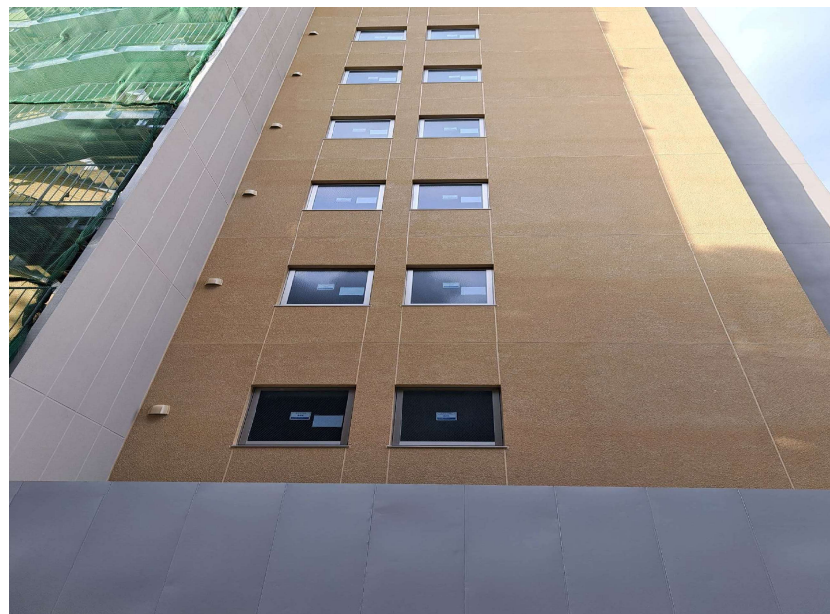

所長に色々ヒヤリングしました。

外壁パネルは14階までシート貼ったために
ベニヤは1回も取り替えず使用出来ましたとの事でした。
ベニヤ材料費は大幅なコストダウンが出来る（大工は儲かったと思います）
難点は建築は解体を翌日か、翌々日にやるために
表面硬化がされておらず、
コンクリートが付着しいくらかはがれる事との事。
その為にピンホール形状のいくらか補修が発生した。
型枠存置期間が取れば良好な結果が得られる。
土木、擁壁は存置期間が取れば、補修ナシで出来るでしょう。

階段段々施工の件

段々は左官工で無くてもシート上からやるので土工でも出来る。
左官の腕前を必要としない（左官は仕事無くなるために、遠慮気味で有った）
専属、懇意にしている左官工が施工するシステムを作る。
以上です。
